



古川雨水排水ポンプ場工事だより



発注者：秋田市上下水道局 担当：下水道整備課 下水道整備第二係 018-864-1455

令和6年9月号



各工事の進捗状況 及び お知らせ

建設工事：引込施設・ポンプ場（基礎・躯体）・吐出水槽・乗り越し管
熊谷・山岡・秋田舗道建設工事共同企業体
工期：令和6年1月29日～令和8年3月23日



引込施設全景（杭打ち工事）



ポンプ場全景(土留工事)



連絡先：現場代理人 鈴木 駿
事務所：018-838-5493

コメント

7月初旬より開始したポンプ場の土留工事(鋼矢板打込み)は順調に進んでおり、進捗は50%程度まで完了しています。引き続き土留工事として、鋼矢板とH鋼杭の打込みを行います。

5月中旬より開始した基礎杭工事※は、ポンプ場から引込施設へ移動し、8月初旬をもって全数施工完了となりました。(計210本)。

※基礎杭工事：建物の基礎となる部

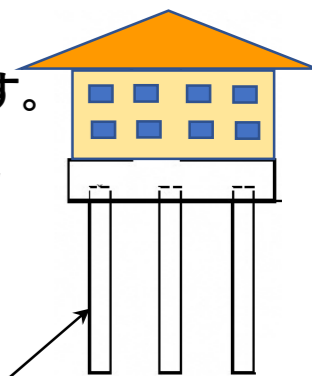

工事のお知らせ

○ポンプ場：土留工事の完了に伴い、9月より土留内部の掘削作業を行います。掘削で発生した土砂を場外へ搬出するため、終日大型ダンプトラックの通行があります。

○ポンプ場・引込施設：引き続き工事資機材搬入出のために大型車両の通行があります。また、一部の車両で早朝・夜間の通行も予定しております。今月より大型ダンプ等の通行が多くなりご迷惑をおかけしますが、引き続きご協力をよろしくお願いいたします。

裏面につづく

公共下水道築造工事：導水渠

山岡・加賀屋・石黒建設特定建設工事共同企業体

工期：令和6年1月12日～令和7年3月21日

連絡先：現場代理人 高橋 浩樹

事務所：018-826-1616



コメント

今月は基礎コンクリートの養生期間中に測量等を行って、第二週頃からボックスカルバート（幅 2.8m×高 2.8m）の据付作業を行っていく予定です。

相変わらず、湧水量が多く24時間排水を行っております。ご迷惑をお掛けしますがご協力をお願い致します。

工事のお知らせ

管布設工(ボックスカルバート据付)を行っていきます。

大型車両で材料の搬入(1日4～5台を予定)等を行いますが、**安全第一**で作業しますのでご協力をお願いします。

機械設備工事：

西島・山岡・秋田東北建設工事共同企業体

工期：令和6年3月18日～令和8年3月23日

連絡先：現場代理人 菊池 圭紘

事務所：022-223-3971

コメント

現在、主ポンプ設備及びゲート・除塵機設備の製作図の作成中になります。

現場工事は、令和7年度から予定しております。



コラム型水中ポンプ
(イメージ図)

電気設備工事：

本荘電気・松澤電気・ライトン特定建設工事共同企業体

工期：令和6年6月7日～令和8年3月23日

連絡先：現場代理人 渡邊 淳

事務所：018-823-7281

コメント

現在、自家発電設備及び受変電設備機器製作図の作成中になります。

現場工事は、令和7年度から予定しております。



ガスタービン発電機
(イメージ図)
