

古川雨水排水ポンプ場工事だより



発注者：秋田市上下水道局 担当：下水道整備課 下水道整備第二係 018-864-1455

令和7年11月号



各工事の進捗状況 及び お知らせ

建設工事：引込施設・ポンプ場（基礎・躯体）・吐出水槽・乗り越し管

熊谷・山岡・秋田舗道建設工事共同企業体


工期：令和6年1月29日～**令和9年3月24日**

(工期変更)

連絡先：現場代理人 松本 佳人

事務所：018-838-5493

ポンプ棟/ポンプ井・水路 スクリーン棟/着水槽・スクリーン水路・沈砂池躯体構築

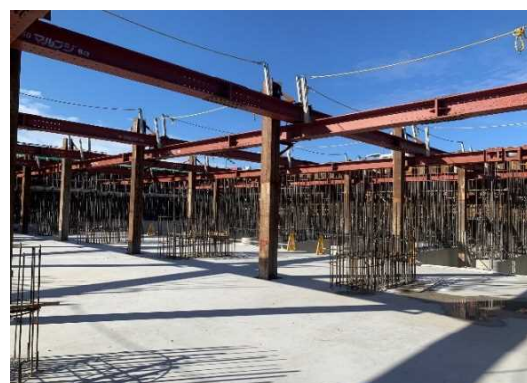

ポンプ井方向
柱壁コンクリート工事中

沈砂池方向
柱壁コンクリート工事中



ポンプ場は、仮設山止め支保工解体と、底版上からの柱・壁躯体コンクリート工事を進めて行きます。今月は**ポンプ場**で資機材の搬入搬出車両が多くなります。引き続き**ポンプ場入り口前の電光掲示板でのご案内**をいたします。

引込施設では、地下躯体および接続水路準備工事が完了したので、**接続水路本体工事**を開始します。

引き続き工事車両の出入り等により、ご迷惑をおかけしますがご協力いただきますようお願いいたします。

引込施設
接続水路工
地盤改良
工事



裏面につづく

公共下水道築造工事：導水渠

山岡・加賀屋・石黒建設特定建設工事共同企業体

工期：令和6年1月12日～令和8年3月23日

(工期変更)

連絡先：現場代理人 高橋 浩樹

事務所：018-826-1616



コメント

11月はコンクリート基礎養生後、ボックスカルバートを布設して
引込施設に接続したのちに埋戻しを行っていきます。

※ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。



河川敷整備工事：

秋田舗道株式会社

工期：令和7年8月29日～令和8年3月23日

連絡先：現場代理人 奈良 誠

事務所：018-862-4898



コメント

11月4日からの工事着手を予定しております。

ゴルフ場の掘削・土砂運搬を行います。

※堤防に鉄板を敷いておりますので、通行の際は足元にご注意をお願いします。



機械設備工事：


西島・山岡・秋田東北建設工事共同企業体

工期：令和6年3月18日～令和9年3月24日

(工期変更)

連絡先：現場代理人 菊池 圭紘

事務所：022-223-3971



コメント

現在、設備機器の製作を進めております。
なお、現場の作業は、建設工事と工程を
調整しながらの実施を予定しております。

電気設備工事：

本荘電気・松澤電気・ライトン

特定建設工事共同企業体

工期：令和6年6月7日～令和9年3月24日

(工期変更)

連絡先：現場代理人 渡邊 淳

事務所：018-823-7281

コメント

現在、設備機器の製作を進めております。
なお、現場の作業は、建設工事と工程を
調整しながらの実施を予定しております。



護岸工事：

伊藤工業 株式会社

工期：令和7年4月1日～令和8年3月19日

連絡先：現場代理人 大友 朝陽

事務所：018-886-2135

コメント

9月からの施工開始を予定しておりましたが、
ポンプ場本体工事との工程調整により、工事着手
を見合わせております。詳細が決まりましたら改
めてご案内いたします。

ご不明な点がございましたら連絡をお願いします。

