



古川雨水排水ポンプ場工事だより



発注者：秋田市上下水道局 担当：下水道整備課 下水道整備第二係 018-864-1455

令和7年3月号

工事着手から一年が経過します！！ 引き続き無事故無災害で頑張ります。



各工事の進捗状況 及び お知らせ

建設工事：引込施設・ポンプ場（基礎・躯体）・吐出水槽・乗り越し管

熊谷・山岡・秋田舗道建設工事共同企業体


工期：令和6年1月29日～令和8年3月23日

連絡先：現場代理人 鈴木 駿

事務所：018-838-5493

引込施設
底板鉄筋組立

乗り越し管
護岸ブロック設置

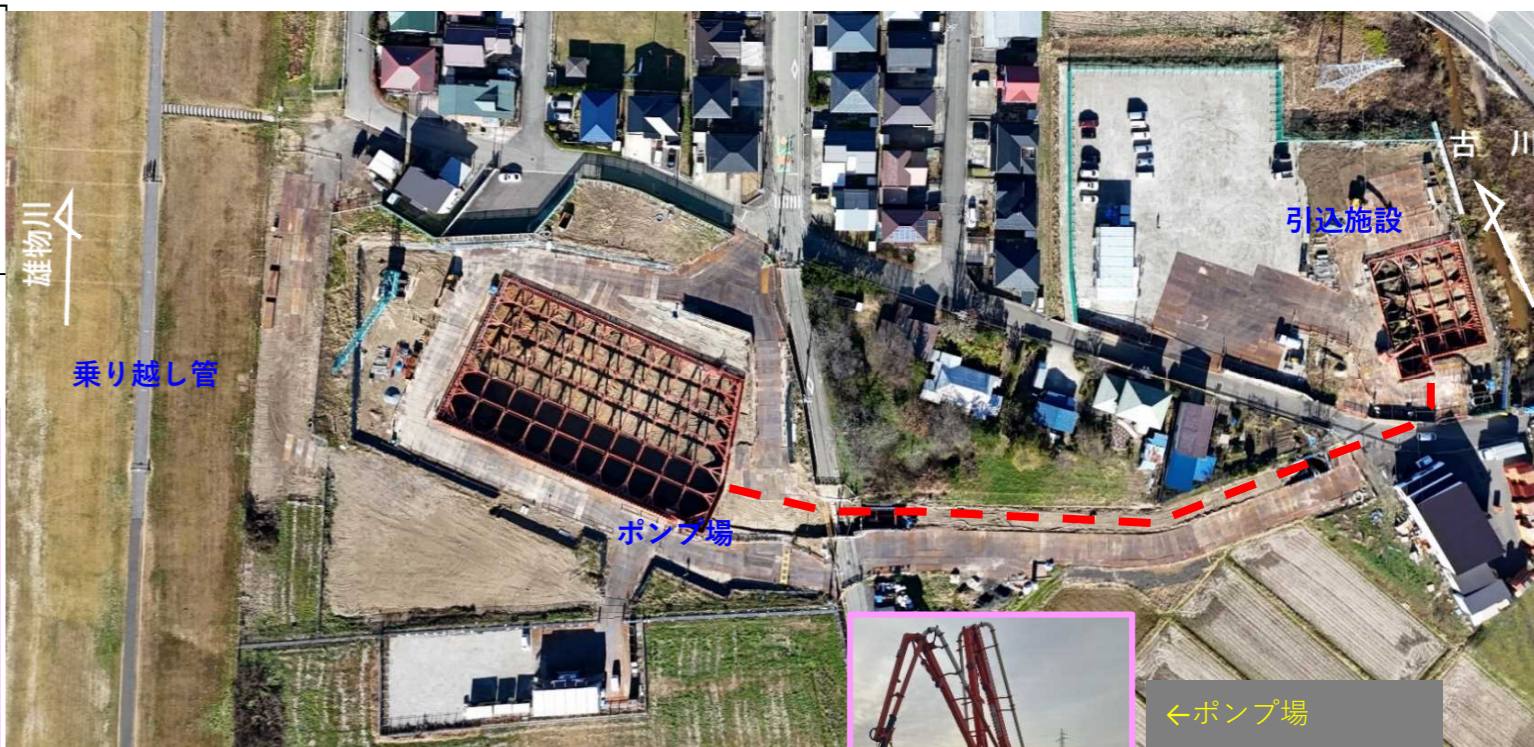

コメント

各工事箇所において、引き続き、大型車両の通行を予定しております。また、3月は引込施設において、本体構造物の大規模コンクリート工事を実施いたします。作業に長時間を要するため、施工当日は、早朝から夕方以降の作業時間となるほか、生コン車の搬出入が100往復程度となる予定です。作業日については改めてお知らせいたします。何卒ご理解していただき、ご協力のほどよろしくお願いいたします。



←ポンプ場
コンクリート圧送車

ポンプ場→
山留内部へ
コンクリート圧送



裏面につづく


公共下水道築造工事：導水渠

山岡・加賀屋・石黒建設特定建設工事共同企業体

工期：令和6年1月12日～令和7年8月22日

連絡先：現場代理人 高橋 浩樹

事務所：018-826-1616



コメント

現在の施工箇所も想定以上の湧水があり、処理しながらの作業となっております。
今月は管基礎工(コンクリート養生)、管布設工(ボックスカルバート据付)、
管路土留工(土留材撤去)、管路土工(埋戻し)を行っていく予定です。
また、管布設に支障となる水道管の移設工事(※別途工事(上下水道局水道建設課発注))に期間を要することから、**令和7年8月22日まで工期を延長させていただくことになりました。**
ご迷惑をお掛けしますがご協力をお願い致します。



工事のお知らせ

大型車両によるボックスカルバートの搬入を3月10日頃から3日間予定しています。
引き続き安全に注意して作業にあたりますのでご協力をお願いします。

機械設備工事：

西島・山岡・秋田東北建設工事共同企業体

工期：令和6年3月18日～令和8年3月23日


連絡先：現場代理人 菊池 圭紘

事務所：022-223-3971

コメント

現在、主ポンプ設備及びゲート・除塵機
設備の製作図の作成中になります。
現場工事は、令和7年度から予定して
おります。

機器紹介



縦：約8.0m

横：約3.0m

【自動除塵機(イメージ図)】
水路に流れてくるゴミ等を取り除く
除塵機を4台設置します。

電気設備工事：

本荘電気・松澤電気・ライトン特定建設工事共同企業体


工期：令和6年6月7日～令和8年3月23日

連絡先：現場代理人 渡邊 淳

事務所：018-823-7281

コメント

現在、自家発電設備及び受変電設備
機器製作図の作成中になります。
現場工事は、令和7年度から予定して
おります。



機器紹介



縦：約50cm

横：約15cm

【電波式水位計(イメージ図)】
古川の水位を検出し、引込ゲートの
開閉制御に関わる重要な装置です。
