



# 古川雨水排水ポンプ場工事だより



発注者：秋田市上下水道局 担当：下水道整備課 下水道整備第二係 018-864-1455

令和7年1月号

令和7年もよろしくお願いたします。良いお年を



## 各工事の進捗状況 及び お知らせ

各工事 冬期（正月）休暇 令和6年12月28日～令和7年1月5日（除雪及び緊急時は除く）

建設工事：引込施設・ポンプ場（基礎・躯体）・吐出水槽・乗り越し管

熊谷・山岡・秋田舗道建設工事共同企業体

工期：令和6年1月29日～令和8年3月23日

連絡先：現場代理人 鈴木 駿

事務所：018-838-5493



ブロックを張り付けるため堤防（どてい）の芝を取り除いています。  
機械が斜めなので気を付けないと。



およそ5mほどあります。  
もう2～4mほど掘ります。深いです。  
水の影響が心配です。

## コメント

掘削を進めると地下水が吹き出て作業が難しくなりますが、それでもおかげさまで何とか事故もなく進んでいます。

1月からより多くのダンプトラックおよびミキサー車が通行します。秋田県の雪は初めてで、工事にどのような影響するかかなり不安ですが皆様の通行の妨げにならないよう善処いたします。

引き続きご協力お願いいたします。

裏面につづく

公共下水道築造工事：導水渠

山岡・加賀屋・石黒建設特定建設工事共同企業体

工期：令和6年1月12日～令和7年3月21日

連絡先：現場代理人 高橋 浩樹

事務所：018-826-1616



## コメント

1月は、道路に埋設されている管を防護しながら、土留めの設置や掘削を行います。

埋設管の位置には通常の土留めを設置することが出来ないため、土を固めながら掘削作業を行います。

また、引き続き24時間湧水処理を行います。

ご迷惑をお掛けしますがご協力をお願い致します。



## 工事のお知らせ

引き続き道路を通行止めしております。安全に注意して完成を目指しますのでご協力をお願いします。

機械設備工事：

西島・山岡・秋田東北建設工事共同企業体

工期：令和6年3月18日～令和8年3月23日


連絡先：現場代理人 菊池 圭紘

事務所：022-223-3971

## コメント

現在、主ポンプ設備及びゲート・除塵機設備の製作図の作成中になります。

現場工事は、令和7年度から予定しております。



縦：約8.0m

横：約3.0m

【自動除塵機（イメージ図）】  
水路に流れてくるゴミ等を取り除く  
除塵機を4台設置します。

電気設備工事：

本荘電気・松澤電気・ライトン特定建設工事共同企業体

工期：令和6年6月7日～令和8年3月23日


連絡先：現場代理人 渡邊 淳

事務所：018-823-7281

## コメント

現在、自家発電設備及び受変電設備機器製作図の作成中になります。

現場工事は、令和7年度から予定しております。

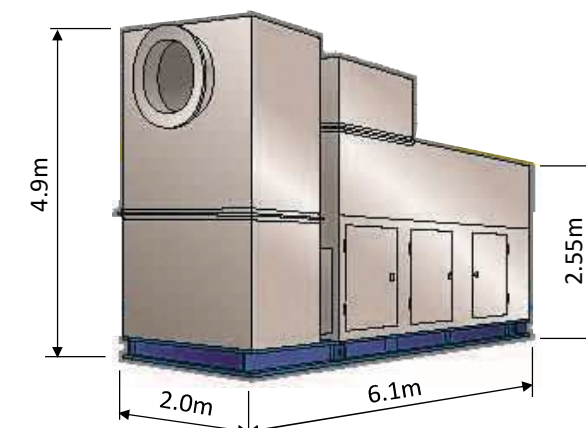

【ガスタービン発電機（イメージ図）】  
4 t ダンプ程度の大きさの発電機を  
2台設置します。
