





古川雨水排水ポンプ場工事だより



発注者：秋田市上下水道局 担当：下水道整備課 下水道整備第二係 018-864-1455

令和7年4月号

今年度も引き続き無事故無災害で頑張ります。

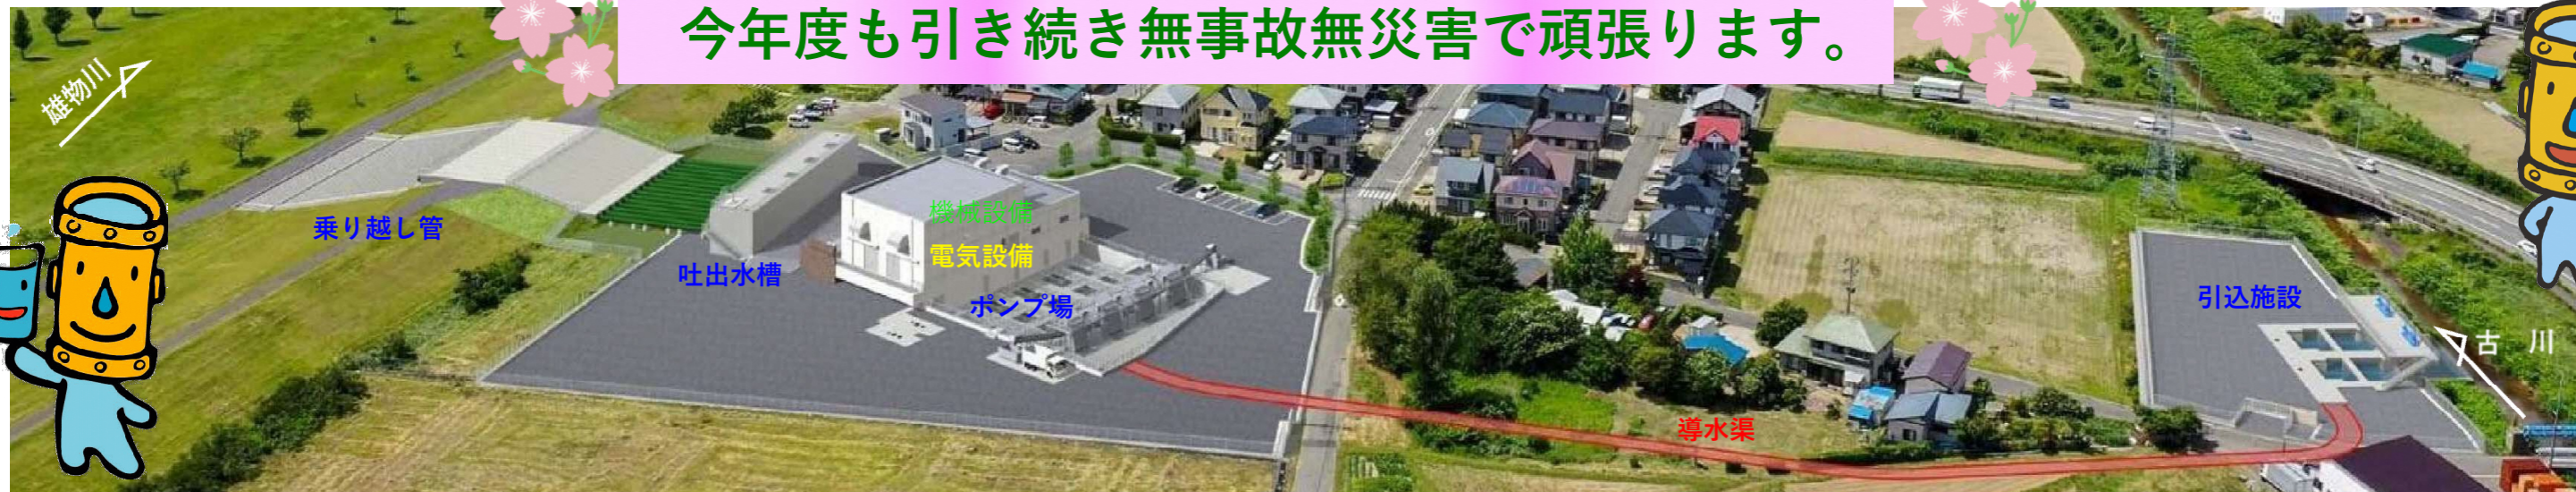


各工事の進捗状況 及び お知らせ

建設工事：引込施設・ポンプ場（基礎・躯体）・吐出水槽・乗り越し管
熊谷・山岡・秋田舗道建設工事共同企業体
工期：令和6年1月29日～令和8年3月23日

連絡先：現場代理人 鈴木 駿
事務所：018-838-5493

乗り越し管
管防護水路設置

ポンプ場
底板鉄筋組立

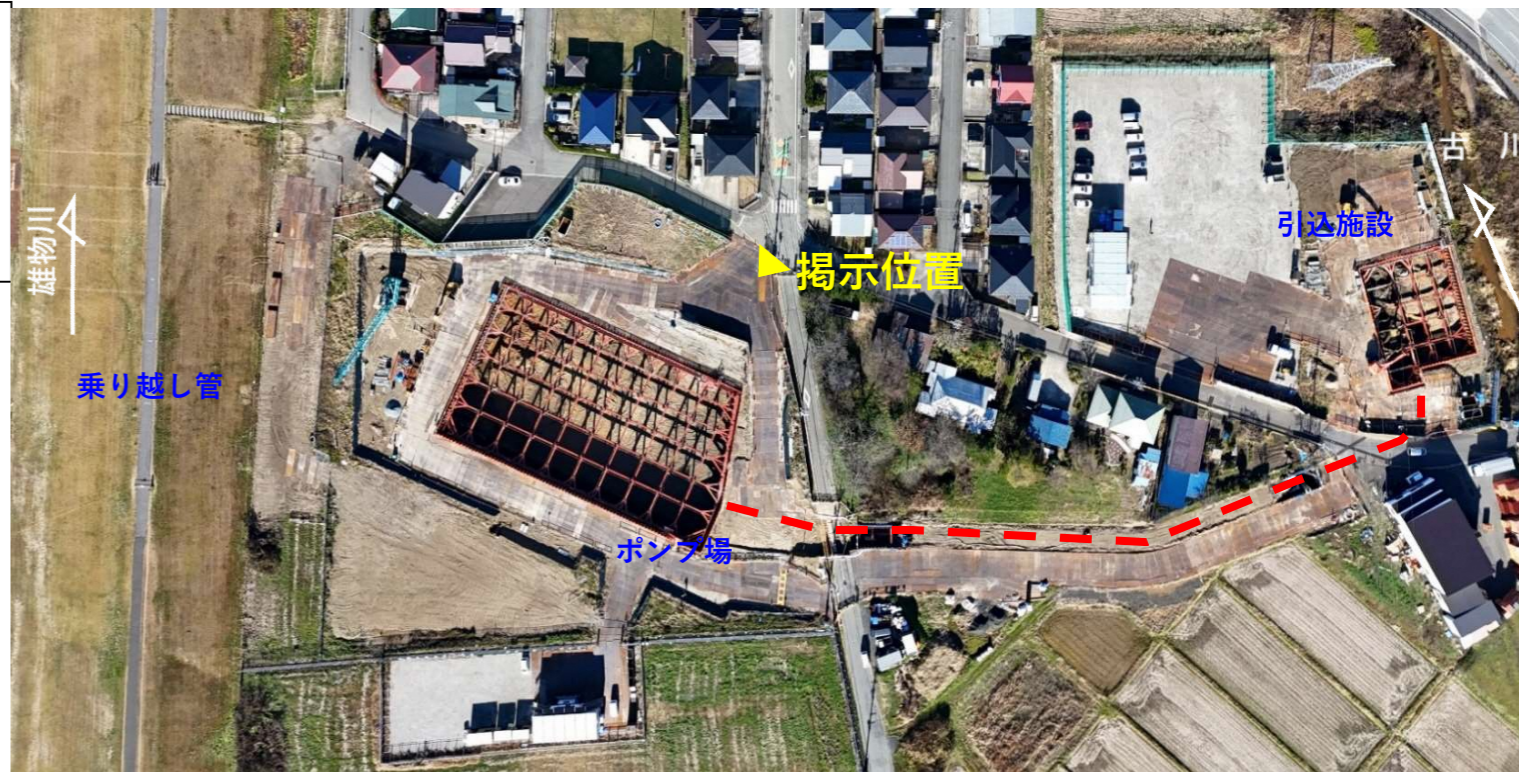

コメント

4月は引込施設およびポンプ場において本体築造に伴うコンクリート工事を実施します。実施日は、4月3日、15日、22日にそれぞれ予定しております。今後コンクリート工事の予定や変更についてはポンプ場北側の交差点に面する入口前へ掲示（右上写真の「掲示位置」）してお知らせいたしますので、そちらからご確認をお願いします。

引き続き、ご迷惑をおかけしますが何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

引込施設
底板コンクリート



裏面につづく

公共下水道築造工事：導水渠

山岡・加賀屋・石黒建設特定建設工事共同企業体

工期：令和6年1月12日～令和7年8月22日

連絡先：現場代理人 高橋 浩樹

事務所：018-826-1616



コメント

先月で現道部分の通行止めが解除できました。長い間ご協力ありがとうございました。
今月はボックスカルバート布設部分の埋戻し・整地等を行った後は、関連して進めている「水道管移設工事」が終了するまで、本工事は一時中止となります。



工事のお知らせ

工事は一時中止となっておりますが現場には常駐しておりますので、何かありましたらご連絡をお願いします。

※工事再開時には改めてPRを行います。

機械設備工事：

西島・山岡・秋田東北建設工事共同企業体

工期：令和6年3月18日～令和8年3月23日

連絡先：現場代理人 菊池 圭紘

事務所：022-223-3971

コメント

現在、主ポンプ設備及びゲート・除塵機設備の製作図の作成中になります。

現場工事は、令和7年度から予定しております。

機器紹介



縦:約8.0m

横:約3.0m

【自動除塵機（イメージ図）】
水路に流れてくるゴミ等を取り除く除塵機を4台設置します。

電気設備工事：

本荘電気・松澤電気・ライトン特定建設工事共同企業体

工期：令和6年6月7日～令和8年3月23日

連絡先：現場代理人 渡邊 淳

事務所：018-823-7281

コメント

現在、自家発電設備及び受変電設備機器製作図の作成中になります。

現場工事は、令和7年度から予定しております。



機器紹介



約170cm

約320cm

【ポンプ場非常用発電装置（イメージ図）】
ポンプ場内に設置する非常用発電装置です。
停電時に電源供給を行う重要な装置です。
