



古川雨水排水ポンプ場工事だより



発注者：秋田市上下水道局 担当：下水道整備課 下水道整備第二係 018-864-1455

令和7年8月号



各工事の進捗状況 及び お知らせ

建設工事：引込施設・ポンプ場（基礎・躯体）・吐出水槽・乗り越し管

熊谷・山岡・秋田舗道建設工事共同企業体

工期：令和6年1月29日～令和8年3月23日


夏期休暇 8月10日～17日（緊急時は除く）

連絡先：現場代理人 松本 佳人

事務所：018-838-5493

スクリーン棟
底版鉄筋組立

ポンプ棟
底版(4)コンクリート完了

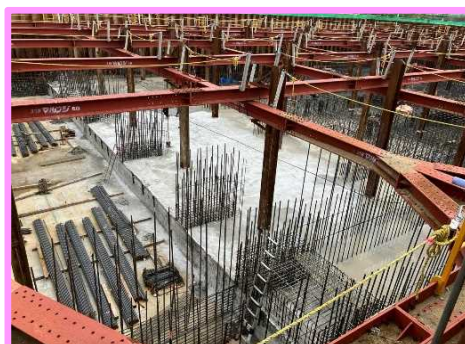

コメント

ポンプ場は、先月に引き続き躯体底版のコンクリート工事を進めています。今月はポンプ場で計4回（うち盆前に1回）

大規模なコンクリート工事を実施予定です。詳細な日時はポンプ場入り口前の電光掲示板でお知らせいたします。

引込施設では、地下部分の躯体工事が完了し、改良土の埋戻しおよび山留鋼矢板の撤去作業等を実施します。

引き続き工事車両の出入り等により、ご迷惑をおかけしますがご協力いただきますようお願いいたします。

引込施設
地上部床版
鉄筋・型枠組立



裏面につづく

公共下水道築造工事：導水渠
山岡・加賀屋・石黒建設特定建設工事共同企業体
工期：令和6年1月12日～令和7年8月22日



夏期休暇 8月9日～17日（緊急時は除く）

連絡先：現場代理人 高橋 浩樹

事務所：018-826-1616



コメント

工事は一時中止となっておりますが現場には常駐しております。

ご不明な点などありましたら連絡をお願いします。

※工事再開時には改めてPRを行います。

護岸工事：護岸整備工事
伊藤工業 株式会社
工期：令和7年4月1日～令和8年3月19日



夏期休暇 8月9日～17日（緊急時は除く）

連絡先：現場代理人 大友 朝陽

事務所：018-886-2135



コメント

施工開始予定は9月からの予定です。


ご不明な点がありましたら連絡をお願いします。

機械設備工事：
西島・山岡・秋田東北建設工事共同企業体
工期：令和6年3月18日～令和8年3月23日

夏期休暇 8月9日～17日（緊急時は除く）

連絡先：現場代理人 菊池 圭紘

事務所：022-223-3971



機器紹介



【ポンプ井排水ポンプ（イメージ図）】
ポンプ井に滞留する雨水を古川に圧送・
排水するためのポンプを設置します。

コメント

現在、設備機器の製作を進めております。
なお、現場の作業は、建設工事と工程を
調整しながらの実施を予定しております。

電気設備工事：
本荘電気・松澤電気・ライトン特定建設工事共同企業体
工期：令和6年6月7日～令和8年3月23日


夏期休暇 8月9日～17日（緊急時は除く）

連絡先：現場代理人 渡邊 淳

事務所：018-823-7281



機器紹介

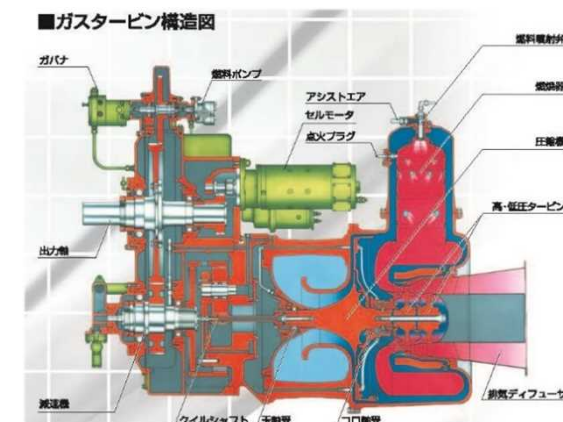

【ガスタービン構造図】

主ポンプ運転用発電装置に搭載されるガスタービンの構造図です。大量の空気を吸い込み、まず『圧縮機』で空気を圧縮し、『燃焼器』で高圧の空気に燃料を噴射し、燃焼させます。最後に高温高圧となった気体が『タービン』を回転させ、動力を回転力として取り出します。

コメント

現在、設備機器の製作を進めております。
なお、現場の作業は、建設工事と工程を
調整しながらの実施を予定しております。
