



# 古川雨水排水ポンプ場工事だより



発注者：秋田市上下水道局 担当：下水道整備課 下水道整備第二係 018-864-1455

令和7年9月号



## 各工事の進捗状況 及び お知らせ

建設工事：引込施設・ポンプ場（基礎・躯体）・吐出水槽・乗り越し管

熊谷・山岡・秋田舗道建設工事共同企業体

工期：令和6年1月29日～令和8年3月23日

連絡先：現場代理人 松本 佳人

事務所：018-838-5493


ポンプ棟 底版型枠工事

スクリーン棟 底版コンクリート工事



ポンプ井方向  
壁型枠組立中

沈砂池方向  
底版鉄筋  
組立中

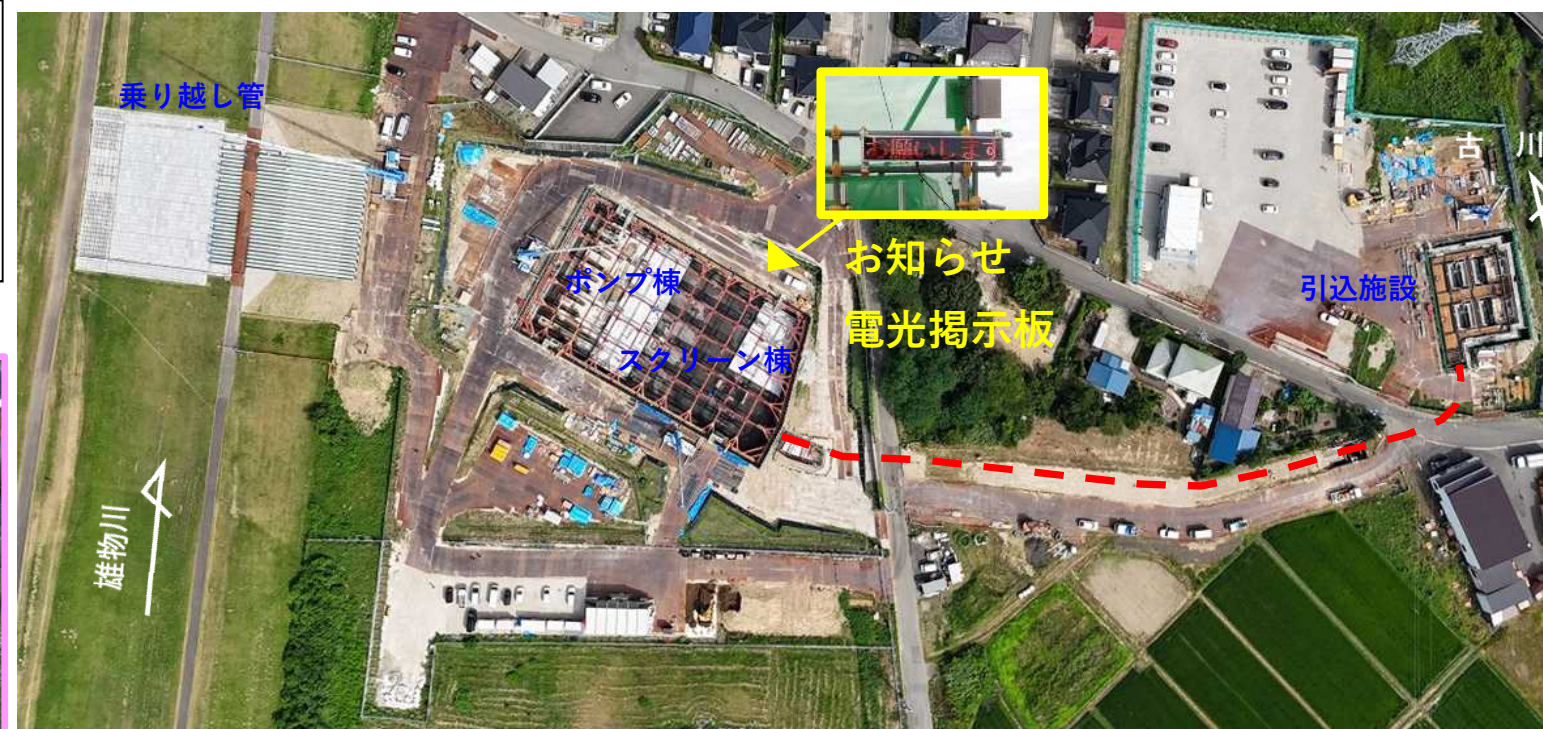

ポンプ場は、先月に引き続き躯体底版のコンクリート工事を進めています。今月はポンプ場で2回大規模なコンクリート工事を実施予定です。詳細な日時はポンプ場入り口前の電光掲示板でお知らせいたします。

引込施設では、地下部分の躯体工事が完了し、改良土の埋戻しおよび山留鋼矢板の撤去作業等を実施します。

引き続き工事車両の出入り等により、ご迷惑をおかけしますがご協力いただきますようお願いいたします。

引込施設  
地上部床版  
コンクリート  
打設



裏面につづく



公共下水道築造工事：導水渠

山岡・加賀屋・石黒建設特定建設工事共同企業体

工期：令和6年1月12日～令和7年11月14日



連絡先：現場代理人 高橋 浩樹

事務所：018-826-1616



## コメント

工事再開により仁助橋手前が通行止めとなり、車両および歩行者も通り抜けできなくなります。詳細は看板やお知らせ文書をご覧ください。**※ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。**

護岸工事：護岸整備工事

伊藤工業 株式会社

工期：令和7年4月1日～令和8年3月19日



連絡先：現場代理人 大友 朝陽

事務所：018-886-2135




## コメント

9月からの施工開始を予定しておりましたが、ポンプ場本体工事との工程調整により、工事着手を見合わせております。詳細が決まりましたら改めてご案内いたします。

機械設備工事：

西島・山岡・秋田東北建設工事共同企業体

工期：令和6年3月18日～令和8年3月23日



## 機器紹介



【吐水管フラップ弁（イメージ図）】  
ポンプ吐出し管の端部に取り付け、吐出水槽からの雨水逆流を防止するために設置します。


## コメント

現在、設備機器の製作を進めております。  
なお、現場の作業は、建設工事と工程を調整しながらの実施を予定しております。

電気設備工事：

本荘電気・松澤電気・ライトン特定建設工事共同企業体

工期：令和6年6月7日～令和8年3月23日



## 機器紹介



【直流電源盤】（イメージ図）  
受変電設備及び発電設備機器の制御電源として直流電力を供給します。  
また蓄電池を搭載しているので停電時のバックアップ電源となるための重要な装置となります。

## コメント

現在、設備機器の製作を進めております。  
なお、現場の作業は、建設工事と工程を調整しながらの実施を予定しております。
