

令和4年11月定例会

予算決算委員会資料
(観光文化スポーツ部)

動物園施設等整備事業について

令和4年度当初予算「動物園施設等整備事業」の猛禽舎改修工事について、鉄骨等の腐食が当初の想定より進行していたことから、鉄骨部分の補修等を行う。

1 工事概要（現契約）

- ・工事名 猛禽舎改修工事
- ・受注者 中央土建株式会社
- ・契約金額 38,563,800円
- ・工期 令和4年6月29日から令和5年1月27日まで
- ・工事内容 経年劣化した鉄骨、外壁等の改修
- ・施設概要

竣工	平成2年度（鉄骨造）
施設面積	311.67㎡
飼育動物	イヌワシ3羽、シロフクロウ3羽、シマフクロウ1羽

2 変更内容等

(1) 変更理由

当初、鉄骨部分のさび落としのみを行う予定としていたが、足場を組み、さび落としを行う過程で、鉄骨部分の補修等を行う必要が生じたため。

(2) 主な変更内容

(単位：千円)

区分	変更前	変更後	補正額	変更内容
本体工事	14,006	19,000	4,994	鉄骨部分の補修や接合部分の金属の交換
附属工事	2,834	5,534	2,700	脱出防止ネット固定のための金属部補修
諸経費	0	1,900	1,900	工期延長に伴う経費
その他	21,724	21,724	0	外壁、外構、設備関係
計	38,564	48,158	9,594	

(3) 財源内訳


(単位：千円)

区分	変更前	変更後	補正額
工事請負費	38,564	48,158	9,594
市債（動物園整備債）	38,300	48,100	9,800
一般会計繰入金	264	58	△206

(4) 工期

- ・5か月延長
- ・繰越明許費を設定し、施工期限を令和5年1月27日から同年6月30日に変更

猛禽舎改修工事説明資料

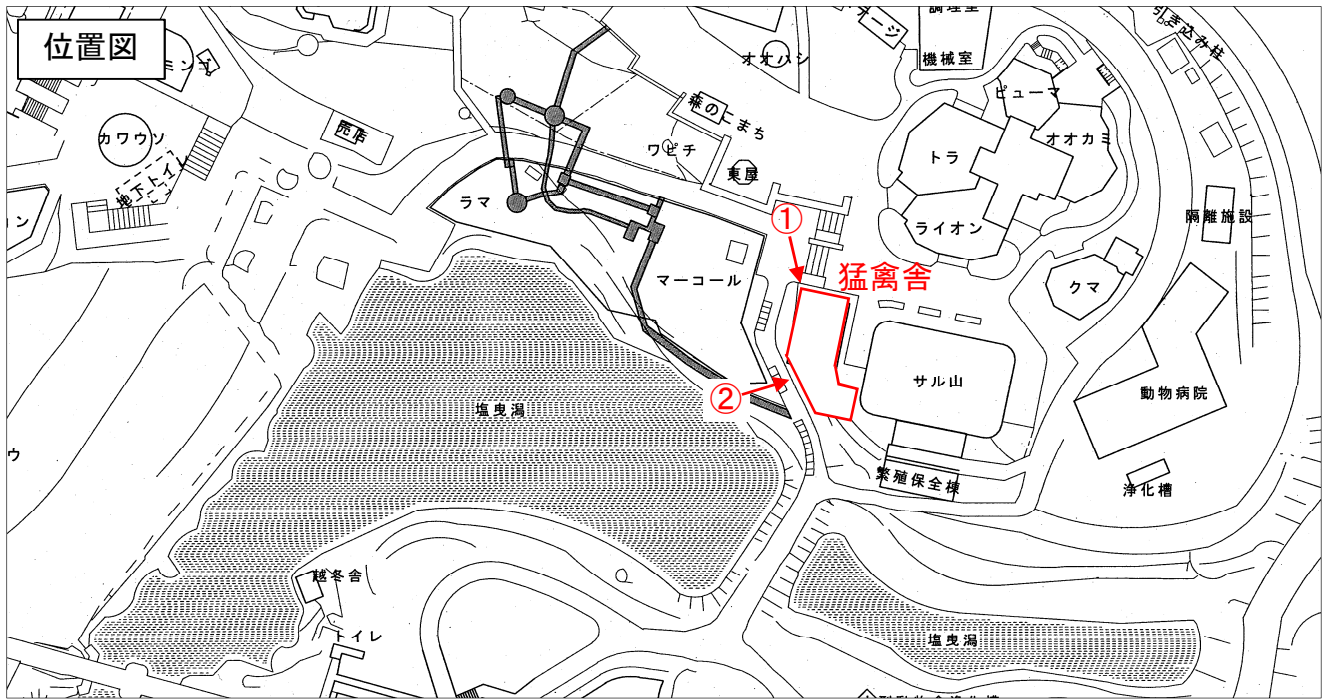

①猛禽舎改修工事前(北側)



②猛禽舎改修工事前(西側)



事前調査時(令和3年9月)



さび落とし後の状況(令和4年8月)
